

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022

“SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES”

ACTIVIDADES	LOGROS OBTENIDOS	METAS CUMPLIDAS (%)
INSPECCION DE OBRAS Y/O PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA	SE HA INSPECCIONADO LA EJECUCION DE 13 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS	70.00%
INSPECCION DE OBRAS Y/O PROYECTOS POR (ONTRATA)	SE HA INSPECCIONADO LA EJECUCION DE 07 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR CONTRATA	70.00%
INSPECCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA	SE HA INSPECCIONADO LA EJECUCION DE 12 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS	80.00%
INSPECCION DE ACTIVIDADES DE PLANES DE NEGOCIOS	SE HA INSPECCIONADO LA EJECUCION DE 03 PLANES DE NEGOCIOS	70.00%
INSPECCION DE ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTES TECNICOS)	SE HA INSPECCIONADO LA ELABORACION DE 11 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A LAS DISTINTAS UNIDADES FORMULADORAS	90.00%
INSPECCION DE ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO	SE HA EVALUADO LA ELABORACION DE 12 FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO	100.00%
REVISION DE PLANES DE TRABAJO	SE HA EVALUADO LA ELABORACION DE 27 PLANES DE TRABAJO	100.00%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
ESTADO SITUACIONAL 2022

“SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES”

**“OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA
(CONTRATA) 2022”**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022



“CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI: 2538785



FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1	Obra	:	"CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", CUI N° 2538785				
2	Ubicación	:	Asociacion de Vivienda 28 de Agosto				
			Distrito		:	CIUDAD NUEVA	
3	Cliente	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA				
4	Contratista	:	JP & CA CONSTRUCTORA SAC				
5	Supervision	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA				
6	Financiamiento	:	5- Recursos Determinados				
7	Sistema de Contratacion	:	SUMA ALZADA				
8	Tipo de Proceso	:	AS-SM-5-2022-MDCN-T-1				
9	Presupuesto Base	:	S/	1,233,864.92	con I.G.V.		
10	Contrato Contratista N°	:	CONTRATO N°007-2022-MDCN-T				
11	Factor de Relacion (Fr)	:	0.80771				
12	Monto del Contrato	:	S/	996,599.79	con I.G.V.	% incidencia	% total incidencia
13	Adicional de Obra N° 01	:	S/	146,424.21	con I.G.V.	13.37%	9.01%
14	Deductivo Vinculante N° 01	:	S/	47,770.07	con I.G.V.	4.36%	
15	Monto Total para la Ejecucion de la Obra	:	S/	1,095,253.93	con I.G.V.		
16	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento (10%)	:	S/	99,659.98	con I.G.V.		
17	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento Real (Monto de Contrato+Adicional)	:	S/	109,525.39	con I.G.V.		
18	Deficit de Cobro de retencion	:	S/	9,865.41	con I.G.V.		
19	Plazo Inicial de Obra	:	04/07/2022 - 16/10/2022 105 dias calendarios				
20	Suspension de plazo	:	14/10/2022 -05/12/2022 53 dias calendarios				
21	Ampliacion de Plazo	:	09/12/2022 - 18/12/2022 10 dias calendarios				
22	Plazo Total para culminacion de la obra	:	110 dias calendarios				
23	porcentaje de avance fisico acumulado	:	89.38% al 31 de diciembre 2022				
24	Situacion de la Obra	:	En ejecucion, fuera de plazo				

PANEL FOTOGRAFICO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022



“REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACIÓN 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2518336.



FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1	Obra	:	"REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACIÓN 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" CUI N° 2518336		
2	Ubicación	:	Asociacion de Vivienda 28 de Agosto		
			Distrito	:	CIUDAD NUEVA
3	Cliente	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
4	Contratista	:	ALTICA CONSTRUCCION S.R.L.		
5	Supervision	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
6	Financiamiento	:	5- 18 Recursos Determinados		
7	Sistema de Contratacion	:	Precios Unitarios		
8	Tipo de Proceso	:	AS-SM-18-2022-CS-MDCN-T-1		
9	Presupuesto Base	:	S/	934,445.09	con I.G.V.
10	Contrato Contratista N°	:	CONTRATO N°020-2022-MDCN-T		
11	Factor de Relacion (Fr)	:	0.88447		
12	Monto del Contrato	:	S/	826,489.66	con I.G.V.
13	Monto Total para la Ejecucion de la Obra	:	S/	826,489.66	con I.G.V.
14	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento (10%)	:	S/	82,649.00	con I.G.V.
15	Plazo Inicial de Obra	:	01/02/2023 - 17/03/2023 45 dias calendarios		
16	Plazo Total para culminacion de la obra	:	45 dias calendarios		
17	Situacion de la Obra	:	Por iniciar la ejecucion fisica de la obra		

PANEL FOTOGRAFICO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI: 2506912



FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA				
1	Obra	:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE INTIORKO TRAMO AV. LOS PRECURSORES - AV. 01 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"	
2	Ubicación	:	Asoc. 23 de enero, calle intiorko	
			Distrito	: CIUDAD NUEVA
3	Cliente	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA	
4	Contratista	:	SERVITRAN-GG	
5	Supervision	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA	
6	Financiamiento	:	Canon minero	
7	Sistema de Contratacion	:	PRECIOS UNITARIOS	
8	Tipo de Proceso	:	AS-SM-007-2022-MDCN-T-1	
9	Presupuesto Base	:	S/ 1,688,022.23	con I.G.V.
10	Contrato Contratista N°	:	Contrato N° 009-2022-MDCN-T	
11	Factor de Relacion (Fr)	:	-	INCIDENCIA RESPECTOR A LA INCIDENCIA TOTAL
12	Monto del Contrato	:	S/ 1,688,022.18	MODIFICIACION DE MODIFICACIONES
13	Adicional de Obra N° 01	:	S/ 260,229.86	14.74% 4.40%
14	Mayores Metrados N° 01	:	S/ 4,822.38	0.27%
15	Mayores Metrados N° 02	:	S/ 16,842.44	0.95%
16	Mayores Metrados N° 03	:	S/ 6,237.40	0.35%
17	Deductivo vinculante de Obra N° 01	:	S/ 195,474.26	-11.07%
18	Reduccion de obra N° 01	:	S/ 14,910.62	-0.84%
19	Monto Total para la Ejecucion de la Obra	:	S/ 1,765,769.38	
20	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento (10%)	:	S/ 168,802.22	
21	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento Real (Monto de Contrato+Adicional)	:	S/ 176,576.94	
22	Deficit de Cobro de retencion	:	S/ 7,774.72	
23	Plazo Inicial de Obra	:	10/08/2022 - 07/11/2022	90 dias calendarios
24	Ampliacion de Plazo N° 01	:	08/11/2022 - 15/11/2022	08 dias calendarios
25	Ampliacion de Plazo N° 02	:	11/11/2022 - 08/12/2022	28 dias calendarios
26	Suspension de plazo	:	07/12/2022 -28/12/2022	22 dias calendarios
27	Porcentaje de ejecucion	:	100%	al 31 de diciembre 2022
28	Plazo Total para culminacion de la obra	:	121	dias calendarios
29	Situacion de la Obra	:	Culminada	



SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES

PANEL FOTOGRAFICO



9 ene. 2023 10:50:27
Tacna



9 ene. 2023 10:50:32
Tacna



9 ene. 2023 10:49:50
Tacna





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITÉ 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA” con CUI: 2461469



FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1	Obra	:	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITÉ 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA"		
2	Ubicación	:	COMITÉ 23		
			Distrito	:	CIUDAD NUEVA
3	Cliente	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
4	Contratista	:	CONSORCIO CIUDAD NUEVA		
5	Supervision	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
6	Financiamiento	:	Canon minero		
7	Sistema de Contratacion	:	SUMA ALZADA		
8	Tipo de Proceso	:	AS N°009-2022-MDCN-T		
9	Presupuesto Base	:	S/	1,415,588.32	<i>con I.G.V.</i>
10	Contrato Contratista N°	:	CONTRATO N° 008-2022-MDCN-T		
11	Factor de Relacion (Fr)	:	0.89485		
12	Monto del Contrato	:	S/	1,266,742.92	<i>con I.G.V.</i>
13	Adicional de Obra N° 01	:	S/	176,255.56	<i>con I.G.V.</i>
14	Deductivo Vinculante N° 01	:	S/	25,376.49	<i>con I.G.V.</i>
15	Monto Total para la Ejecucion de la Obra	:	S/	1,417,621.99	<i>con I.G.V.</i>
16	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento (10%)	:	S/	126,674.29	<i>con I.G.V.</i>
17	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento Real (Monto de Contrato+Adicional)	:	S/	141,762.20	<i>con I.G.V.</i>
18	Deficit de Cobro de retencion	:	S/	15,087.91	<i>con I.G.V.</i>
19	Plazo Inicial de Obra	:	06/07/2022 - 18/10/2022 105 días calendarios		
20	Suspension de plazo	:	12/10/2022 -15/12/2022 64 días calendarios		
21	Ampliacion de Plazo	:	22/12/2022 - 31/12/2022 10 días calendarios		
22	Plazo Total para culminacion de la obra	:	179 <i>días calendarios</i>		
23	Situacion de la Obra	:	No Culminada		



SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES

PANEL FOTOGRAFICO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITÉ 31 DE LA AMPLIACIÓN A.H.M. CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”



FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1	Obra	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 31 DE LA AMPLIACION A.H.M. CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"		
2	Ubicación	:	COMITÉ 31		
			Distrito	:	CIUDAD NUEVA
3	Cliente	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
4	Contratista	:	CONSORCIO LIBERTAD		
5	Supervision	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
6	Financiamiento	:	Canon minero		
7	Sistema de Contratacion	:	SUMA ALZADA		
8	Tipo de Proceso	:	AS-SM-14-2022-MDCN-T-1		
9	Presupuesto Base	:	S/ 1,936,773.35	<i>con I.G.V.</i>	
10	Contrato Contratista N°	:	CONTRATO N°016-2022-MDCN-T		
11	Factor de Relacion (Fr)	:	1.00000		
12	Monto del Contrato	:	S/ 1,936,773.35	<i>con I.G.V.</i>	
13	Adicional de Obra N° 01	:	S/ 92,825.34	<i>con I.G.V.</i>	
14	Deductivo Vinculante N° 01	:	S/ 3,450.01	<i>con I.G.V.</i>	
15	Monto Total para la Ejecucion de la Obra	:	S/ 2,026,148.68	<i>con I.G.V.</i>	
16	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento (10%)	:	S/ 193,677.34	<i>con I.G.V.</i>	
17	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento Real (Adicional)	:	S/ 8,937.53	<i>con I.G.V.</i>	
18	Plazo Inicial de Obra	:	11/10/2022 - 07/02/2023 120 dias calendarios		
19	Plazo Total para culminacion de la obra	:	120 <i>dias calendarios</i>		
20	Situacion de la Obra	:	AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 SE PRESENTO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE S/1,815,878.75 (INC. IGV), LO QUE REPRESENTA UN 93.76% .		



SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES

PANEL FOTOGRAFICO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITÉ 7 DEL A.H.M. CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI: 2534917



FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1	Obra	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITÉ 7 DEL A.H.M. CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"	
2	Ubicación	:	COMITÉ 7	
			Distrito	: CIUDAD NUEVA
3	Cliente	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA	
4	Contratista	:	CONSORCIO PROGRESO	
5	Supervision	:	PERLIMA E.I.R.L.	
6	Financiamiento	:	Canon minero	
7	Sistema de Contratacion	:	SUMAALZADA	
8	Tipo de Proceso	:	AS N°019-2022-MDCN-T	
9	Presupuesto Base	:	S/ 1,435,785.19	<i>con I.G.V.</i>
10	Contrato Contratista N°	:	CONTRATO N° 022-2022-MDCN-T	
11	Factor de Relacion (Fr)	:	0.99865	
12	Monto del Contrato	:	S/ 1,433,852.35	<i>con I.G.V.</i>
13	Adicional de Obra N° 01	:	S/ 0.00	<i>con I.G.V.</i>
14	Deductivo Vinculante N° 01	:	S/ 0.00	<i>con I.G.V.</i>
15	Monto Total para la Ejecucion de la Obra	:	S/ 1,433,852.35	<i>con I.G.V.</i>
16	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento (10%)	:	S/ 143,385.24	<i>con I.G.V.</i>
17	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento Real (Monto de Contrato+Adicional)	:	S/ 143,385.24	<i>con I.G.V.</i>
18	Deficit de Cobro de retencion	:	S/ 0.00	<i>con I.G.V.</i>
19	Plazo Inicial de Obra	:	01/02/2023 - 01/05/2023 90 dias calendarios	
20	Suspension de plazo	:	-	-
21	Ampliacion de Plazo	:	-	-
22	Plazo Total para culminacion de la obra	:	90	<i>dias calendarios</i>
23	Situacion de la Obra	:	En Ejecucion	



SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES

PANEL FOTOGRAFICO






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITÉ 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

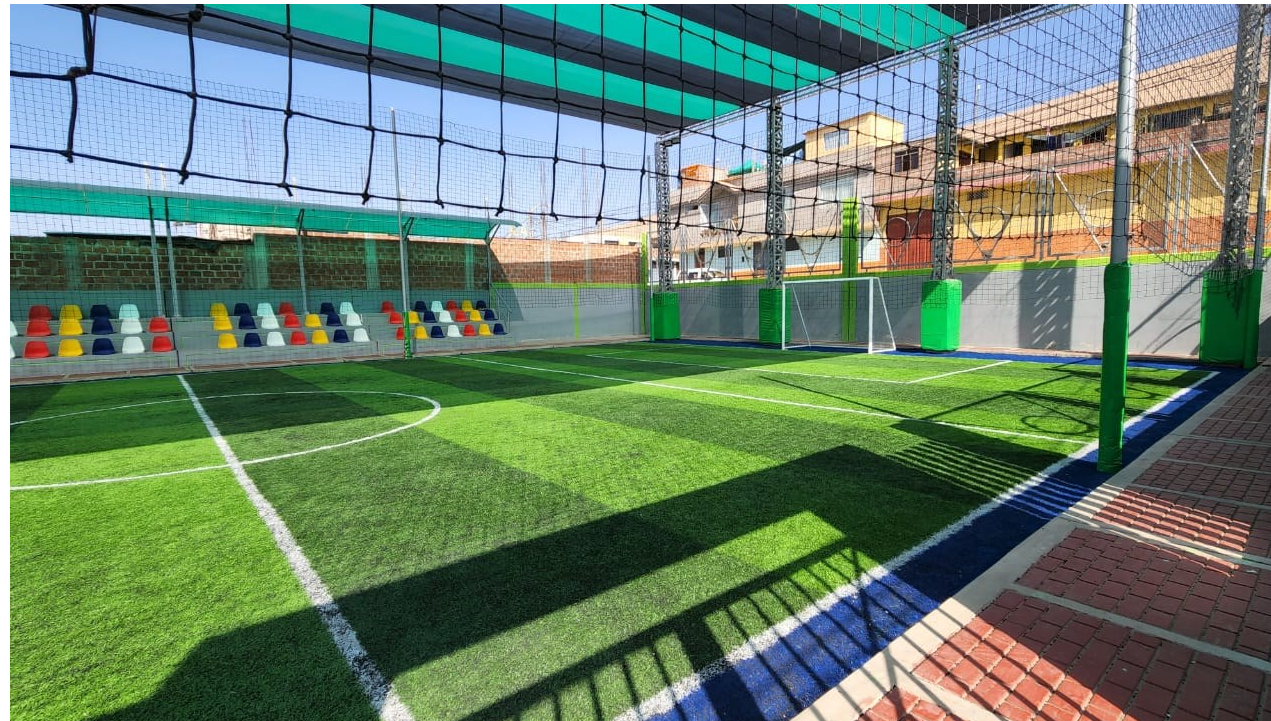

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1	Obra	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITÉ 3 DE LA ASOC. DE VV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"		
2	Ubicación	:	COMITÉ 3		
			Distrito	:	CIUDAD NUEVA
3	Cliente	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
4	Contratista	:	CONSORCIO 28 DE AGOSTO		
5	Supervision	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA		
6	Financiamiento	:	Canon minero		
7	Sistema de Contratacion	:	SUMA ALZADA		
8	Tipo de Proceso	:	AS N°011-2022-MDCN-T		
9	Presupuesto Base	:	S/ 769,744.31	con I.G.V.	
10	Contrato Contratista N°	:	CONTRATO N° 010-2022-MDCN-T		
11	Factor de Relacion (Fr)	:	0.90000		
12	Monto del Contrato	:	S/ 692,769.88	con I.G.V.	
13	Adicional de Obra N° 01	:	S/ 74,284.81	con I.G.V.	
14	Deductivo Vinculante N° 01	:	S/ 0.00	con I.G.V.	
15	Monto Total para la Ejecucion de la Obra	:	S/ 767,054.69	con I.G.V.	
16	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento (10%)	:	S/ 69,276.99	con I.G.V.	
17	Monto de Retencion de Fiel Cumplimiento Real (Monto de Contrato+Adicional)	:	S/ 76,705.47	con I.G.V.	
18	Deficit de Cobro de retencion	:	S/ 7,428.48	con I.G.V.	
19	Plazo Inicial de Obra	:	20/08/2022 - 17/11/2022	90 días calendarios	
20	Suspension de plazo	:	16/11/2022 - 15/12/2022	30 días calendarios	
21	Ampliacion de Plazo	:	18/12/2022 - 30/12/2022	13 días calendarios	
22	Plazo Total para culminacion de la obra	:	133	días calendarios	
23	Situacion de la Obra	:	Obra Culminada		



SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES

PANEL FOTOGRAFICO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022

“LIQUIDACIONES”

Durante el año 2022 el área de liquidaciones de obras realizó las siguientes acciones:

- De 23 liquidaciones por realizar, solo se efectuaron 06 evaluaciones (liquidaciones) Técnico – Financieras de proyectos culminadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022

“LIQUIDACIONES CON CIERRE”

ITEM	Producto / Proyecto	OBSERVACIONES
1	2483277: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	CON CIERRE
2	2485774: ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) SUBPROCESO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	CON CIERRE
3	2238842: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	CON CIERRE
4	2499338: CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO NECOCHEA EN EL TRAMO CALLE HIPOLITO UNANUE - AVENIDA LOS PRECURSORES DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	CON CIERRE
5	2486102: ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	CON CIERRE
6	2483527: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	CON CIERRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ESTADO SITUACIONAL 2022

“LIQUIDACIONES SIN CIERRE”

N°	PROYECTO	ESTADO
1	2153758: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL COMITE 16 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	SIN CIERRE
2	2218151: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	SIN CIERRE
3	2310742: MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	SIN CIERRE
4	2313495: CREACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP TIPO C EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	SIN CIERRE
5	2329058: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL COMITE 05 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	SIN CIERRE
6	2342135: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA	SIN CIERRE
7	2428207: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA JUAN MOORE DEL TRAMO AV. MANUEL CUADROS - AV. LOS PRECURSORES DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	SIN CIERRE
8	2461469: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	SIN CIERRE
9	2428205: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA AVIACION DEL TRAMO AV. MANUEL CUADROS - CA. JUAN SANTOS ATAHUALPA CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	SIN CIERRE
10	2483390: REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO ALTO HORIZONTE DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SIN CIERRE
11	2486275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA VECINAL DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCION PECUARIA SECTOR 8: EMP. PE-38 - EMP. TA-619 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	SIN CIERRE
12	2489746: ADQUISICION DE CONTENEDOR; EN EL(LA) SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SIN CIERRE
13	2491572: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	SIN CIERRE
14	2483527: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA Y PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRIUNFO COMITE 06 DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SIN CIERRE
15	2509368: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ - CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	SIN CIERRE
16	2518333: REMODELACION DE LOSA; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) LOCAL DEPORTIVO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SIN CIERRE
17	2538655: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS OSCAR LINCE ASTURIZAGA N° 98 DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SIN CIERRE
